ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	N	Вид СМР	Срок в кал. дни	Мярка	К-во
1		**Топлоизолация на външни ограждащи стени и подмяна на дограма на корпусА на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов“, ул. "Латинка" №11, район "Изгрев“- СО**	**20 d?**		
2		**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**	**20 d?**		
3	1	Подготовка, мобилизация и временно строителство след подписване Акт обр.2, заявка доставки обект вкл. Дограма по размери от място	2 d	бр.	1
4		**Общо архитектурни ремонтни работи**	**17 d**		
5		**Полагане на топлоизолация по фасади**	**17 d**		
6	1	Доставка, монтаж и демонтаж скеле	5 d	м2	3600
7	2	Очукване на компрометирана мазилка и /или бучарда, включително обезпрашеване на очуканата повърхност и грундиране със заздравяващ грунд или циментов шприц, натоварване и извозване на отпадъците и възстановяване на основата с хастарна мазилка	2 d	м2	230
8	3	Направа на топлоизолация от EPS с дебелина 10см. по фасади, с коеф. На топлопроводност-0,033W/mK, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка -по стени тип № 1, вкл. изграждане на негорими ивици от минерална вата и очукване и възстанов	14 d	м2	2600
9	4	Обръщане около отвори с EPS с деб. 2см., с коеф. на топлопроводност=0,033W/mK, при сутеренните отвори и цокъла -XPS с коеф. На топлопроводност=0,033W/mK интегрирани ъалопротвктори, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка.	12 d	м	2234
10	5	Направа на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см. коефициент на топлопроводност на материала А-0,031 W/mK по стени тип № 2 /цокъла на сградата, при сутеренни стени граничещи с външен въздух/, 2 тераколови шпакловки, стъклофибърна мрежа и минерална мазилка	1 d	м2	160
11	6	Направа на топлоизолация отXPS с дебелина 10см. по еркерни участъци, скоеф. На топлопроводност=0,033W/mK, 2тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка , вкл. водооткапващи профили по периферията	1 d	м	23
12	7	Доставка и монтаж на защитни подпрозоречни первази, вкл. демонтаж на старите съществуващи поли	7 d	м	560
13	8	Натоварване и извозване на отпадъци	3 d	м3	100
14		**Дограма**	**5 d**		
15	9	Демонтаж на стара дограма, вкл. демонтаж на метални решетки или капаци, вкл натоварване и извозване на ненужната дограма	1 d	м2	25
16	10	Доставка и монтаж на фасадна дограма - входни врати, витрини и прозорци, вкл. Обръщане на отворите от вътрешната страна и боя, а отвън монтаж на подпрозоречни первази и демонтираните решетки.	2 d	м2	25
17		Предаване обект	0 d		

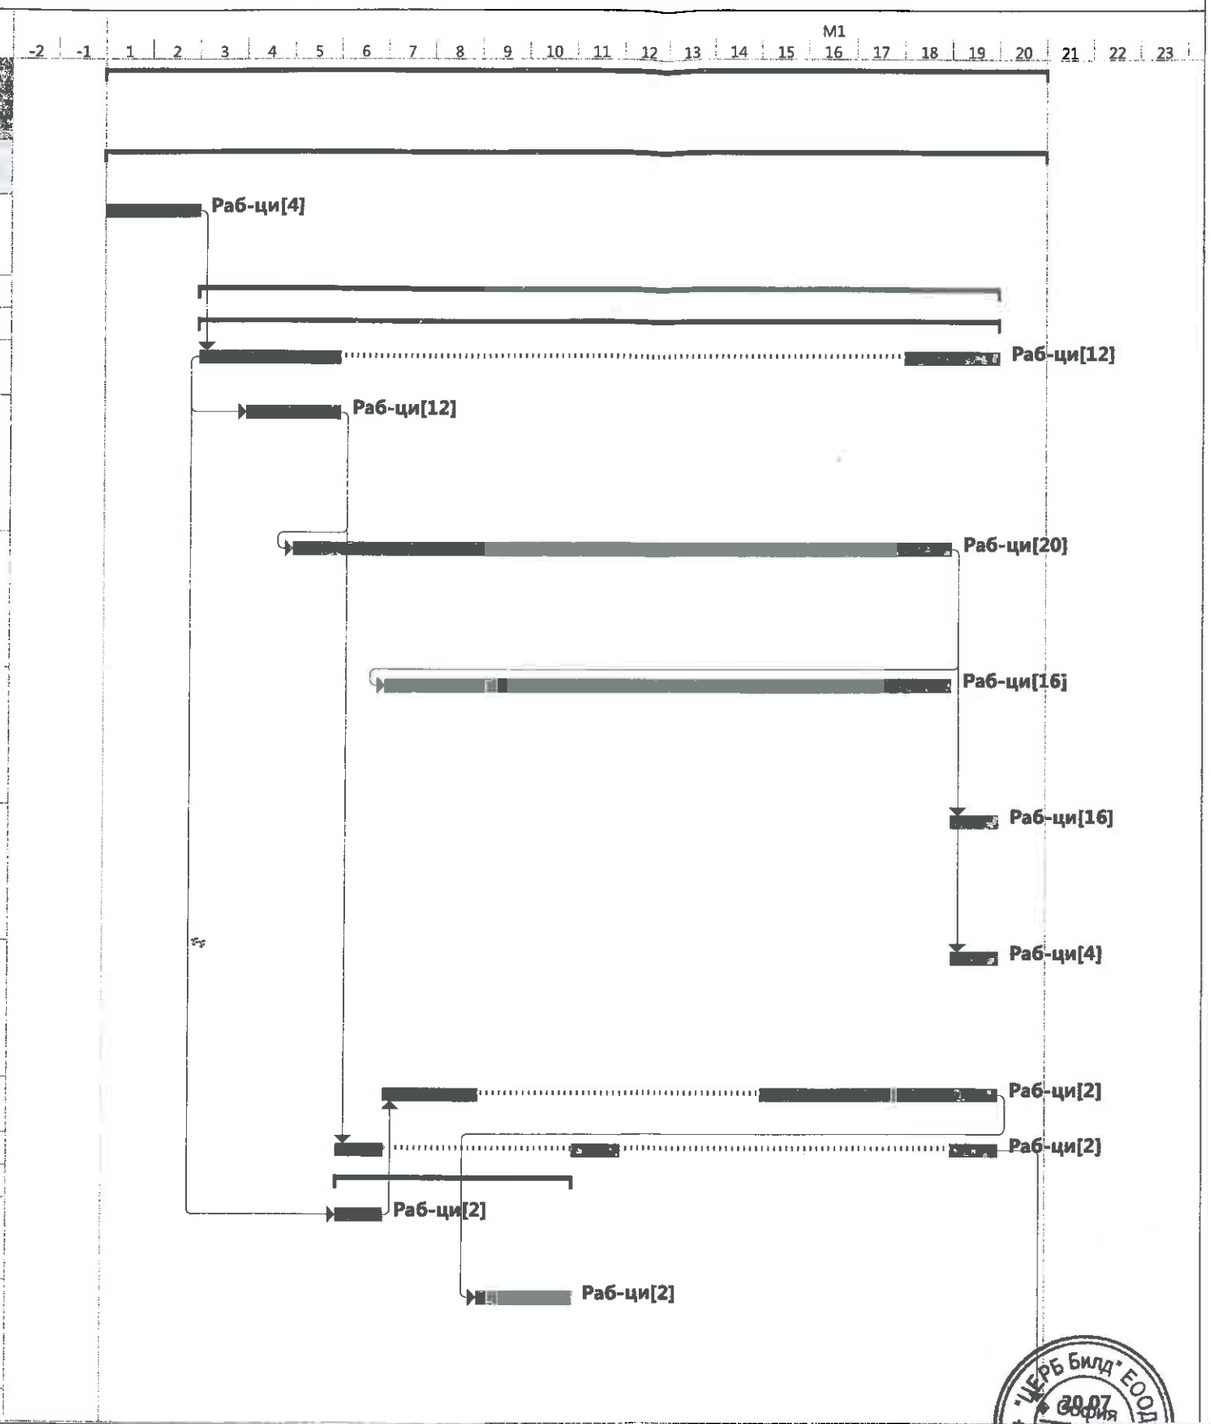

Заложен е срок за изпълнение на СМР от 20 календарни дни, при благоприятни атмосферни условия

Изпълнител: "ЧЕРБ Б
Управител: Таньо

88
